


LA DESCRIPTION

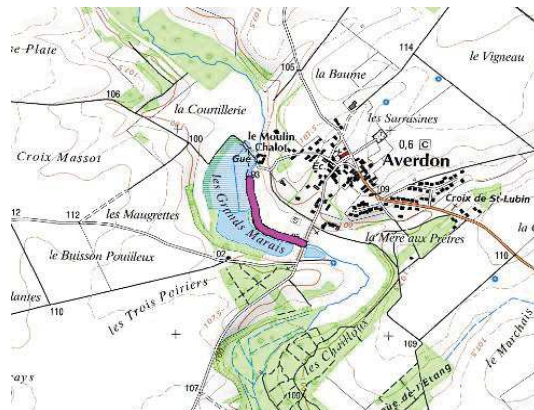

TRVO408

renaturation lourde du lit : réduction de la section

Description de l'action :

Cette action de renaturation a eu lieu dans le cadre d'un chantier international. Il consiste en la création de neuf banquettes de plusieurs natures (minérales, végétalisées avec tressage, végétalisées avec boudins d'hélophytes).

Quantité : 200 ml

Année des travaux : 2013

Coût € : 10 223 €

Commentaire :

La largeur de la Cisse a été réduite d'au moins 50% avec un retour à des écoulements lotiques et un décolmatage importants des substrats présents. Cette action amène un gain écologique majeur sur ce secteur. La mise en place de boudin coco non prévégétalisé pourra engendrer des érosions sur les banquettes après leur dégradation. En effet, il est préférable de mettre en place un cordon de blocs à la place de ces boudins, ou alors de prévégétaliser ceux-ci, pour que la végétation reprenne vite et maintienne les berges.

L'INTEGRITE DE L'HABITAT

COMPARTIMENT	REH 2006	REH 2013	Gain écologique de l'action *
lit mineur	moyen	bon	fort
berges/ripisylve	moyen	moyen	moyen
annexes	bon	bon	
débit	mauvais	mauvais	
ligne d'eau	très bon	très bon	faible ou nul
continuité	mauvais	mauvais	faible ou nul

* Remarque : le gain écologique de l'action peut être important localement, mais insuffisant à l'échelle du segment si l'étendue de l'action est faible.
